

前序

智能项目管理工作台 · 使用手册

管理三级项目、跨项目依赖与周会汇报，自动汇总进度、卡点和风险。

总结	进度	项目明细	周会汇报	后台
健康度与风险洞察	可缩放甘特图	三级明细与关系网	可编辑报告与图片归档	页面、分类和系统管理

数据保存

通过“启动项目管理.cmd”打开应用后，填写记录会写入 D:\06
系统梳理\bao\project-pilot\data\projects.json，并立即回读校验；下一次启动会从该文件恢复。

版本 V1.4 · 更新日期 2026-08-24

01 / QUICK START

开始使用

本应用无需安装。请从指定目录运行启动器，由本地数据服务打开浏览器并管理记录文件。

- 1

进入应用目录

打开 D:\06 系统梳理\bao\project-pilot。请保留 server.js、data 文件夹和页面文件的相对位置。
- 2

运行启动器

双击“启动项目管理.cmd”。命令窗口会显示应用地址和数据文件路径，随后自动打开浏览器。
- 3

保持启动窗口运行

编辑期间不要关闭命令窗口；关闭窗口后页面仍能查看，但无法继续把变更写入数据文件。
- 4

确认文件保存

左下角显示绿色圆点和“已保存到 data/projects.json”，表示文件服务可用且数据已通过回读校验。
- 5

开始录入

先到后台管理维护分类和系统，再点击右上角“新建规划”，填写三级结构、时间、依赖与节点。

重要

projects.json 是正式主数据，projects.backup.json 是上一次保存前的备份。迁移时应复制整个 project-pilot 文件夹，尤其不要遗漏 data 文件夹。


推荐工作习惯

场景	推荐操作
日常编辑	通过启动器进入；保存后检查左下角是否显示 data/projects.json。
每周备份	复制 data/projects.json，并在项目明细页点击“导出”保存独立 JSON。
换电脑 / 换浏览器	复制整个 project-pilot 文件夹；也可在新环境中导入之前导出的 JSON。
多人协作	当前版本为单机工具；由一人维护主数据，并通过 JSON 文件交接。

02 / OVERVIEW

使用总结页

总结页自动读取所有项目，不需要额外填写汇总数字。任何项目变更保存后，统计和风险清单会立即刷新。

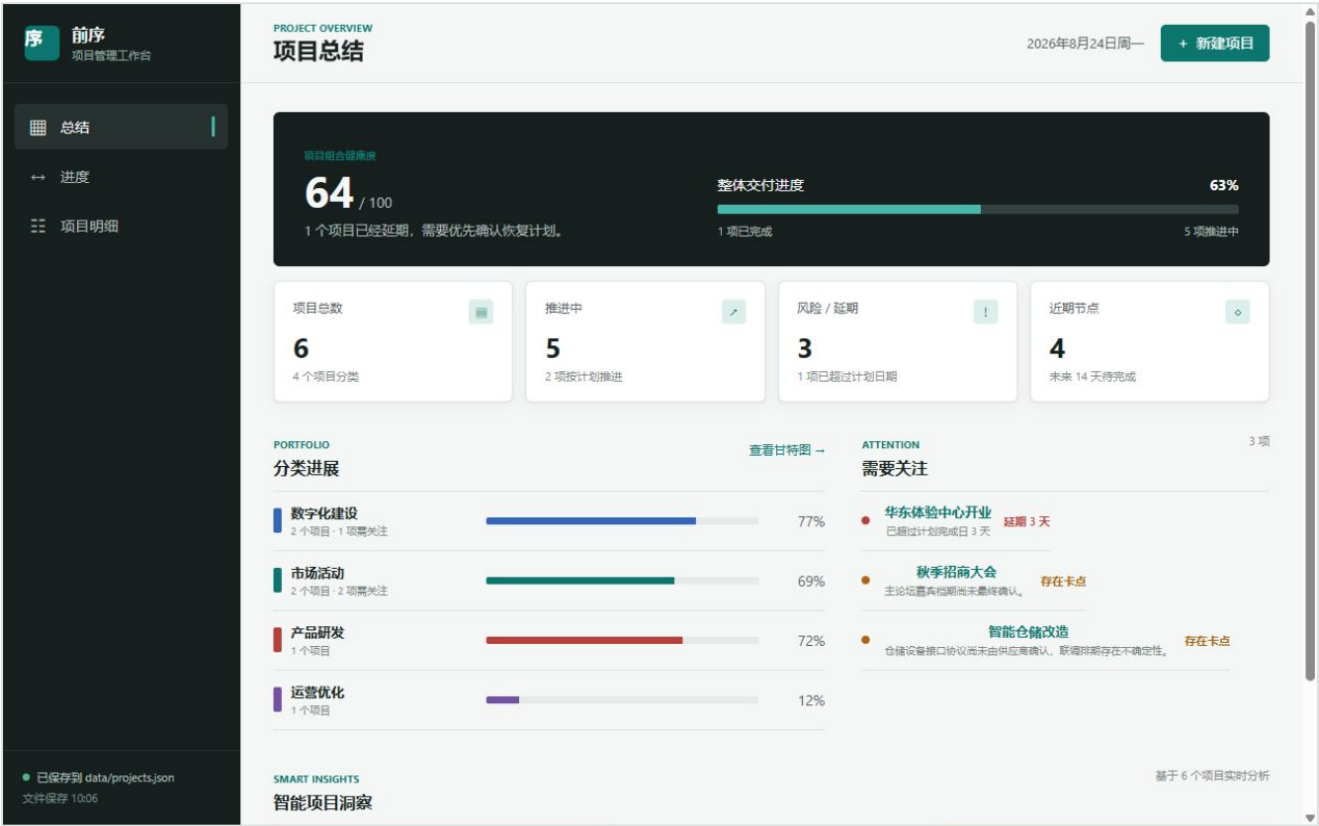

总结页：组合健康度、总体进度、分类进展和需要关注的项目。

区域	如何理解
组合健康度	综合延期项目、风险项目和逾期节点计算，分数越高表示计划越稳定。
整体交付进度	所有项目完成进度的平均值；下方同时显示已完成和推进中的项目数。
分类进展	按项目分类汇总平均进度，并提示每类需要关注的项目数。
需要关注	优先列出已延期、存在卡点、节点逾期或明显落后时间计划的项目。
智能项目洞察	给出优先处理项目、近期节点和负责人负荷提示。

03 / TIMELINE

使用进度页和甘特图

进度页把项目计划、实际进展、关键节点和问题放到一条共同时间轴上，适合周会检查和组合排期。



进度页：左侧固定项目名称，右侧时间轴可横向滚动。

控件 / 标记	用途
搜索、分类、状态	按项目名称或编号快速定位，也可只查看某个分类或状态。
月 / 周 / 日	月视图看全局；周视图用于常规管理；日视图查看节点和详细偏差。
定位今天	把红色“今天”线滚动到可视区域中央。
计划条和实色进度	浅色为计划周期，实色为实际完成比例；细线表示按时间应达到的进度。
菱形和感叹号	菱形表示项目节点；感叹号表示该项目有延期原因或卡点说明。

查看详情

点击任意项目行，可查看实际进度、时间预期、进度偏差、节点清单、卡点和系统给出的处理建议。

04 / THREE LEVELS

三级结构与规划明细

应用采用“项目分类 → 项目 → 项目规划”三级颗粒度。表格中的每一行是一条可独立排期、跟踪和设置依赖的项目规划。

序

AdelNotes

Adakami线上售后项目管理

项目总结

项目进度

项目明细

周会汇报

后台管理

已保存到 data/projects.json

文件保存 14:37

PROJECT DIRECTORY

项目明细

2026年8月24日周一

+ 新建规划

规划明细

分类分布

关系网

搜索分类、项目、规划、编号、系统

状态 全部状态

计划排序 按开始时间

导入

导出

+ 新建规划

分类	项目	项目规划	关联系统	负责人	计划周期
第一层分类 4 合规项目	第二层 - 4.1 减免改造项目	第三层规划 一期 - 审批流改造 P2026-0401	犁剑Sword 资产中台 OA	殷静霞, 张微雨	5/1 - 7/31
第一层分类 1 AI催收	第二层 - 1.2 blu Vtalk	第三层规划 blu Vtalk一期 - 生成式WABA机器人落地 P2026-0601	Blu	葛硕颖	6/1 - 8/19
第一层分类 1 AI催收	第二层 - 1.3 Wiz Chatbot	第三层规划 Wiz Chatbot一期上线 P2026-0602	CDS Waba中台	陈卓凡	6/15 - 9/1
第一层分类 1 AI催收	第二层 - 1.1 AI虚拟坐席	第三层规划 虚拟坐席接入 P2026-0801	犁剑Sword	殷静霞	8/6 - 9/23
第一层分类 1 AI催收	第二层 - 1.1 AI虚拟坐席	第三层规划 AI虚拟坐席协催 P2026-0802	犁剑Sword Blu	殷静霞, 葛硕颖	8/6 - 10/23
第一层分类 2 作业系统优化	第二层 - 2.1 作业提效 - Waba内嵌犁剑开发	第三层规划 整体规划 P2026-0805	Waba中台	汪明天	8/10 - 10/30

规划明细：每行保留一条规划，并用分类色条、第二层项目底色和第三层菱形明确层级。

层级	定义与示例
第一层：项目分类	业务管理主题，例如运营提效、分案策略、合规管控。分类在后台管理中统一维护。
第二层：项目	分类下的具体项目，例如运营提效下的 AI 催收，或合规管控下的减免改造项目。
第三层：项目规划	项目的分期或独立交付单元，例如减免改造项目的一期、二期、三期。没有分期时填写“整体规划”。
规划编号	每条规划必须使用唯一编号，用于搜索、甘特图和依赖关系识别。
系统与负责人	系统用于表达技术影响范围；负责人用于负荷分析。二者都可随规划维护。
计划排序	默认按计划开始时间升序排列；也可在顶部切换为按计划结束时间升序排列。

05 / CATEGORY VIEW

按分类查看项目全貌

在项目明细页切换到“分类分布”，可以从分类向下展开所有项目和细分规划，并集中查看关联系统。




分类分布：第二层项目使用独立标题带和颜色边线，第三层规划在其下逐行展开。

区域	用途
分类标题	显示该分类下的项目数量和规划数量。
项目分组	同名项目的多个分期或规划会集中在同一组内。
关联系统	汇总该项目所有规划关联的系统，便于识别技术影响范围。
规划条目	显示规划编号、日期、状态和前置依赖数量；点击可打开完整详情。

06 / DEPENDENCY NETWORK

使用项目关系网

关系网按“分类泳道 → 第二层项目区 → 第三层规划节点”排布，箭头由前置规划指向依赖它的规划。

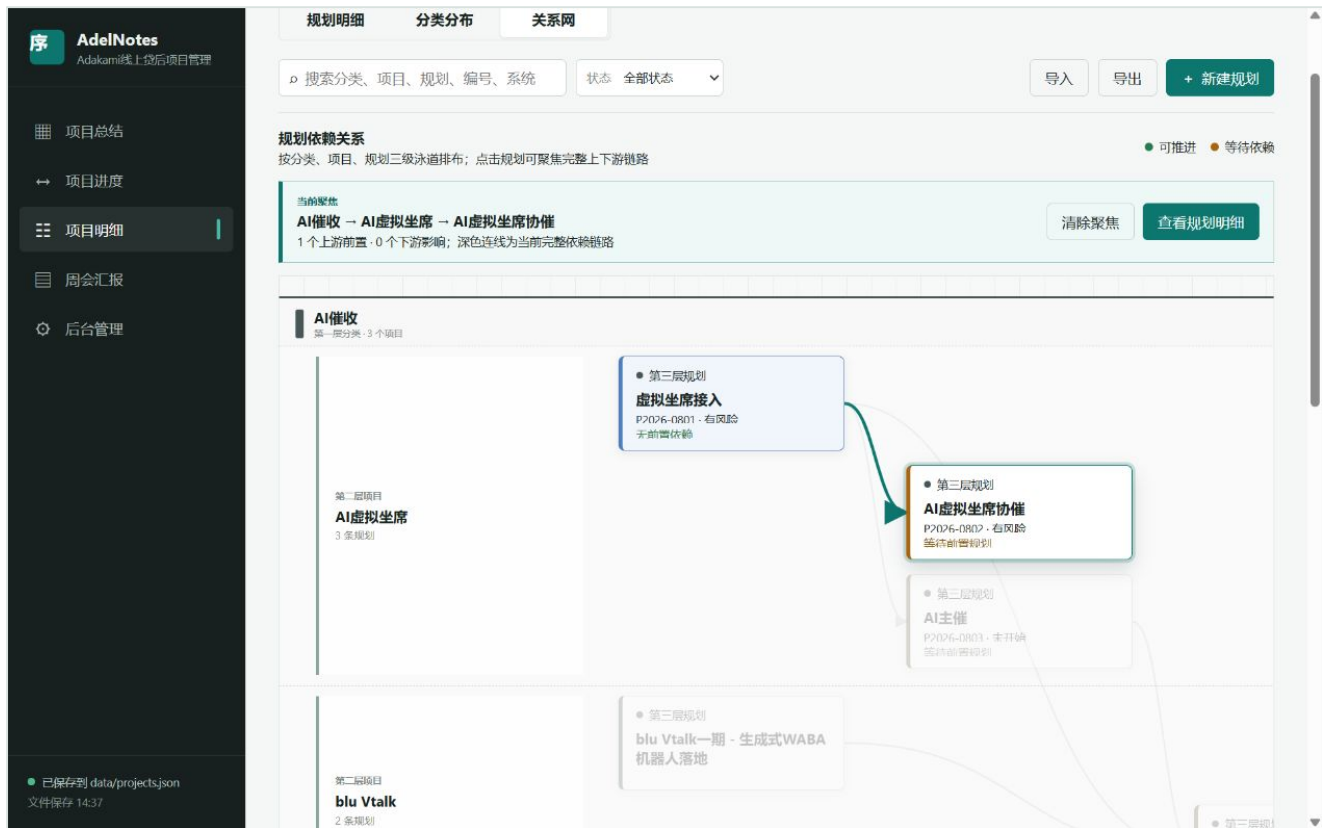

关系网：点击第三层规划后，选中节点、上游前置和下游影响会高亮，其余内容降低显示强度。

1

编辑目标规划

打开需要设置上线条件的规划，例如 AI 催收 / Blu VTalk 二期。

2

勾选前置规划

在“系统与依赖”中选择所有必须先完成的规划，并填写依赖说明。

3

查看关系网

保存后切换到“关系网”；分类、项目和规划会分别显示为泳道、分区和节点。

4

聚焦依赖链

点击任意规划，高亮完整上游和下游链路；聚焦栏会统计前置与影响数量，也可直接打开规划明细。

5

判断可推进状态

绿色表示无未完成前置项；黄色表示仍需等待依赖。应用会阻止形成循环依赖。

07 / WEEKLY REPORTING

生成与保存周会汇报

周会汇报页按第二层项目自由选择，自动读取其下第三层规划的计划完成日、最新状态、进度、下一节点和卡点。



选择汇报日期与项目：默认全选，也可清空后只勾选本周需要向领导汇报的项目。

- 1

选择日期和项目

进入“周会汇报”，确认汇报日期，按第二层项目勾选本次范围。
- 2

生成可编辑报告

点击“生成可编辑汇报”。同一项目的多个规划会自动合并项目单元格，并按规划逐行展示。
- 3

手工修订

可直接修改分类、项目、规划、计划时间、最新进展和卡点；修改仅作用于本次报告快照，不覆盖项目明细。
- 4

保存并归档

滚动到报告底部，点击“保存图片并归档”。PNG 会自动下载，并保存在 data/reports 中。
- 5

管理历史记录

页面下方显示保存时间、项目数和规划数；可再次下载图片，也可删除不再需要的记录。

理解汇报图片

保存后的 PNG 采用分类分段、项目合并、规划逐行的表格结构，可直接用于周会展示或插入文档。

AdelNotes · 项目进展周会汇报

汇报日期：2026年8月24日生成时间：2026/08/24 14:37

项目	规划 / 功能改造	计划时间	最新进展	卡点 / 风险
AI催收				
AI虚拟坐席	AI虚拟坐席协催	10月23日	测试手工调整：方案已确认，准备进入联调。	犁剑现有虚拟坐席方案无法满足印尼需求，需定制
	虚拟坐席接入	9月23日	有风险，当前进度 5%；下一节点：技术方案设计（8月25日）	暂无卡点
	AI主催	11月23日	未开始，当前进度 0%；下一节点：技术方案设计（8月25日）	暂无卡点
blu Vtalk	blu Vtalk一期 - 生成式WABA机器人落地	8月19日	已完成，当前进度 100%；当前已正式推数上线，验证无问题，效果监控中	暂无卡点
	blu Vtalk二期 - 转人工功能	11月30日	未开始，当前进度 0%；下一节点：blu 二期机器人生产测试（10月12日）	暂无卡点
Wiz Chatbot	Wiz Chatbot一期上线	9月1日	进行中，当前进度 87%；下一节点：生产测试（8月26日）	暂无卡点
作业系统优化				
作业提效 - Waba内嵌犁剑开发	整体规划	10月30日	有风险，当前进度 30%；下一节点：生产测试（8月16日）	暂无卡点
策略系统优化				
案件标签改造	整体规划	12月25日	未开始，当前进度 0%	暂无卡点
VeraWork接入	分案提效 - 一期取消CDS	9月23日	未开始，当前进度 0%；下一节点：中台宣讲（8月27日）	暂无卡点
合规项目				
减免改造项目	一期 - 审批流改造	7月31日	已完成，当前进度 100%	260824印尼产研发现方案漏洞，重新设计逻辑补全方案中

本报告由项目管理系统生成，内容以保存时的可编辑快照为准。

汇报图片示例：第一层分类为色带，第二层项目合并单元格，第三层规划逐行显示计划、进展与风险。

快照规则

历史汇报保存的是生成当时并经手工修订后的内容。后续项目状态变化不会改写旧报告；重新生成即可得到最新一期快照。

新建与编辑项目规划

点击“新建规划”或规划表中的任意一行进入编辑窗口。必填项为空、编号重复、日期错误或形成循环依赖时，应用会阻止保存。

编辑窗口：先明确分类、项目和项目规划，再维护系统、依赖、排期与进度。

- 1

填写三级结构

选择项目分类，输入项目名称和项目规划；规划编号必须唯一。
- 2

关联配置

勾选关联系统和前置规划；必要时补充依赖说明。
- 3

设定计划

选择开始日期与计划完成日期，设置当前状态，并拖动滑块填写完成进度。
- 4

添加节点

点击“添加节点”，为每个关键节点填写名称、日期和状态。
- 5

记录问题

在“延期 / 卡点”中说明阻塞，在备注中记录下一步行动或背景信息。
- 6

保存并检查

点击“保存项目”。看到成功提示和左下角绿色状态后，数据会在下次打开时恢复。

10 / ADMINISTRATION

管理页面、分类和系统

后台管理用于控制网页展示内容和基础目录。所有修改与项目规划一起保存在 data/projects.json。

序 前序
项目管理工作台

项目总结

项目进度

项目台账

后台管理

已保存到 data/projects.json
文件保存 12:13

CONTENT ADMINISTRATION
后台管理

2026年8月24日周一

保存页面设置

DISPLAY SETTINGS
页面展示

产品名称

前序

产品副标题

项目管理工作台

总结页名称

项目总结

进度页名称

项目进度

项目明细页名称

项目台账

后台管理页名称

后台管理

保存分类修改

CATEGORY CATALOG
项目分类

数字化建设

2 条规划

×

产品研发

1 条规划

×

市场活动

2 条规划

×

运营优化

1 条规划

×

运营提效

2 条规划

×

后台管理：可编辑品牌和页面名称，维护项目分类颜色及关联系统目录。

管理项	操作规则
页面展示	可修改产品名称、副标题，以及总结、进度、项目明细、周会汇报、后台管理五个页面名称。
项目分类	可添加分类、修改名称和颜色。重命名后会同步更新所属规划；有规划使用时不能直接删除。
关联系统	可添加或重命名系统。仍有规划关联时不能直接删除，需先在规划中解除关联。
保存校验	每次保存都会写入 projects.json 并回读确认，同时保留保存前的 backup 文件。

自动保存、备份与恢复

正式主数据和汇报图片都保存在应用目录内；浏览器缓存只是兼容备份，JSON 导出用于额外归档和跨环境恢复。

自动保存规则

规划、后台配置和汇报记录保存在 data/projects.json；汇报 PNG 保存在 data/reports。每次更新 JSON 前会把旧数据复制为 data/projects.backup.json。

导出备份

1

打开项目明细

从左侧导航进入“项目明细”。

2

点击导出

浏览器会生成“项目数据-日期.json”，其中包含页面设置、分类、系统、规划、依赖、节点和备注。

3

妥善保存

建议每周或重大调整后备份一次，并把导出文件放在 bao\backups 或企业云盘。

导入恢复

1

点击导入

选择之前导出的 JSON 文件。

2

确认替换

导入会替换 data/projects.json 中的全部项目数据；确认前先检查是否需要导出当前数据。

3

核对结果

返回总结页检查项目总数，再抽查甘特图与关键节点。

无法保存到文件时

如果左下角显示“数据文件保存失败”，请确认“启动项目管理.cmd”窗口仍在运行，然后刷新页面重试。不要用双击 index.html 的方式进行正式录入。

常见问题

问题	处理方法
再次打开看不到原数据	确认通过启动器打开，并检查 data/projects.json 是否存在；必要时用 projects.backup.json 或导出文件恢复。
项目自动显示为有风险	检查是否填写了卡点、是否有逾期节点，或实际进度是否比时间计划落后超过 15 个百分点。
项目自动显示为已延期	计划完成日期已经过去且进度未到 100%；更新完成日期或填写恢复计划。
甘特图看不到细节	切换到“周”或“日”，并横向滚动到目标时间。
汇报图片在哪里	进入 project-pilot\data\reports；也可在周会汇报页的历史记录中再次下载。
